



Rehavid · Gestión de proyectos

El flujo del aplicativo · versión 16 (final)

Venta → activación → asignación por cargo → negociación de capacidad →
requisitos → plan de trabajo final → ejecución → cierre automático


VERSIÓN FINAL · agosto de 2026


1 · El flujo completo: qué entra, qué opera el aplicativo y qué sale

La alimentación por bases de Excel y los once pasos de la especificación funcional 1.1. Cada fila muestra la información que se ingresa, la operación que hace la herramienta y el resultado.

REHAVID · GESTIÓN DE PROYECTOS v16 · EL FLUJO QUE HACE EL APP

La alimentación por bases de Excel y los once pasos del flujo (especificación 1.1) · qué se ingresa, qué opera la herramienta y qué sale

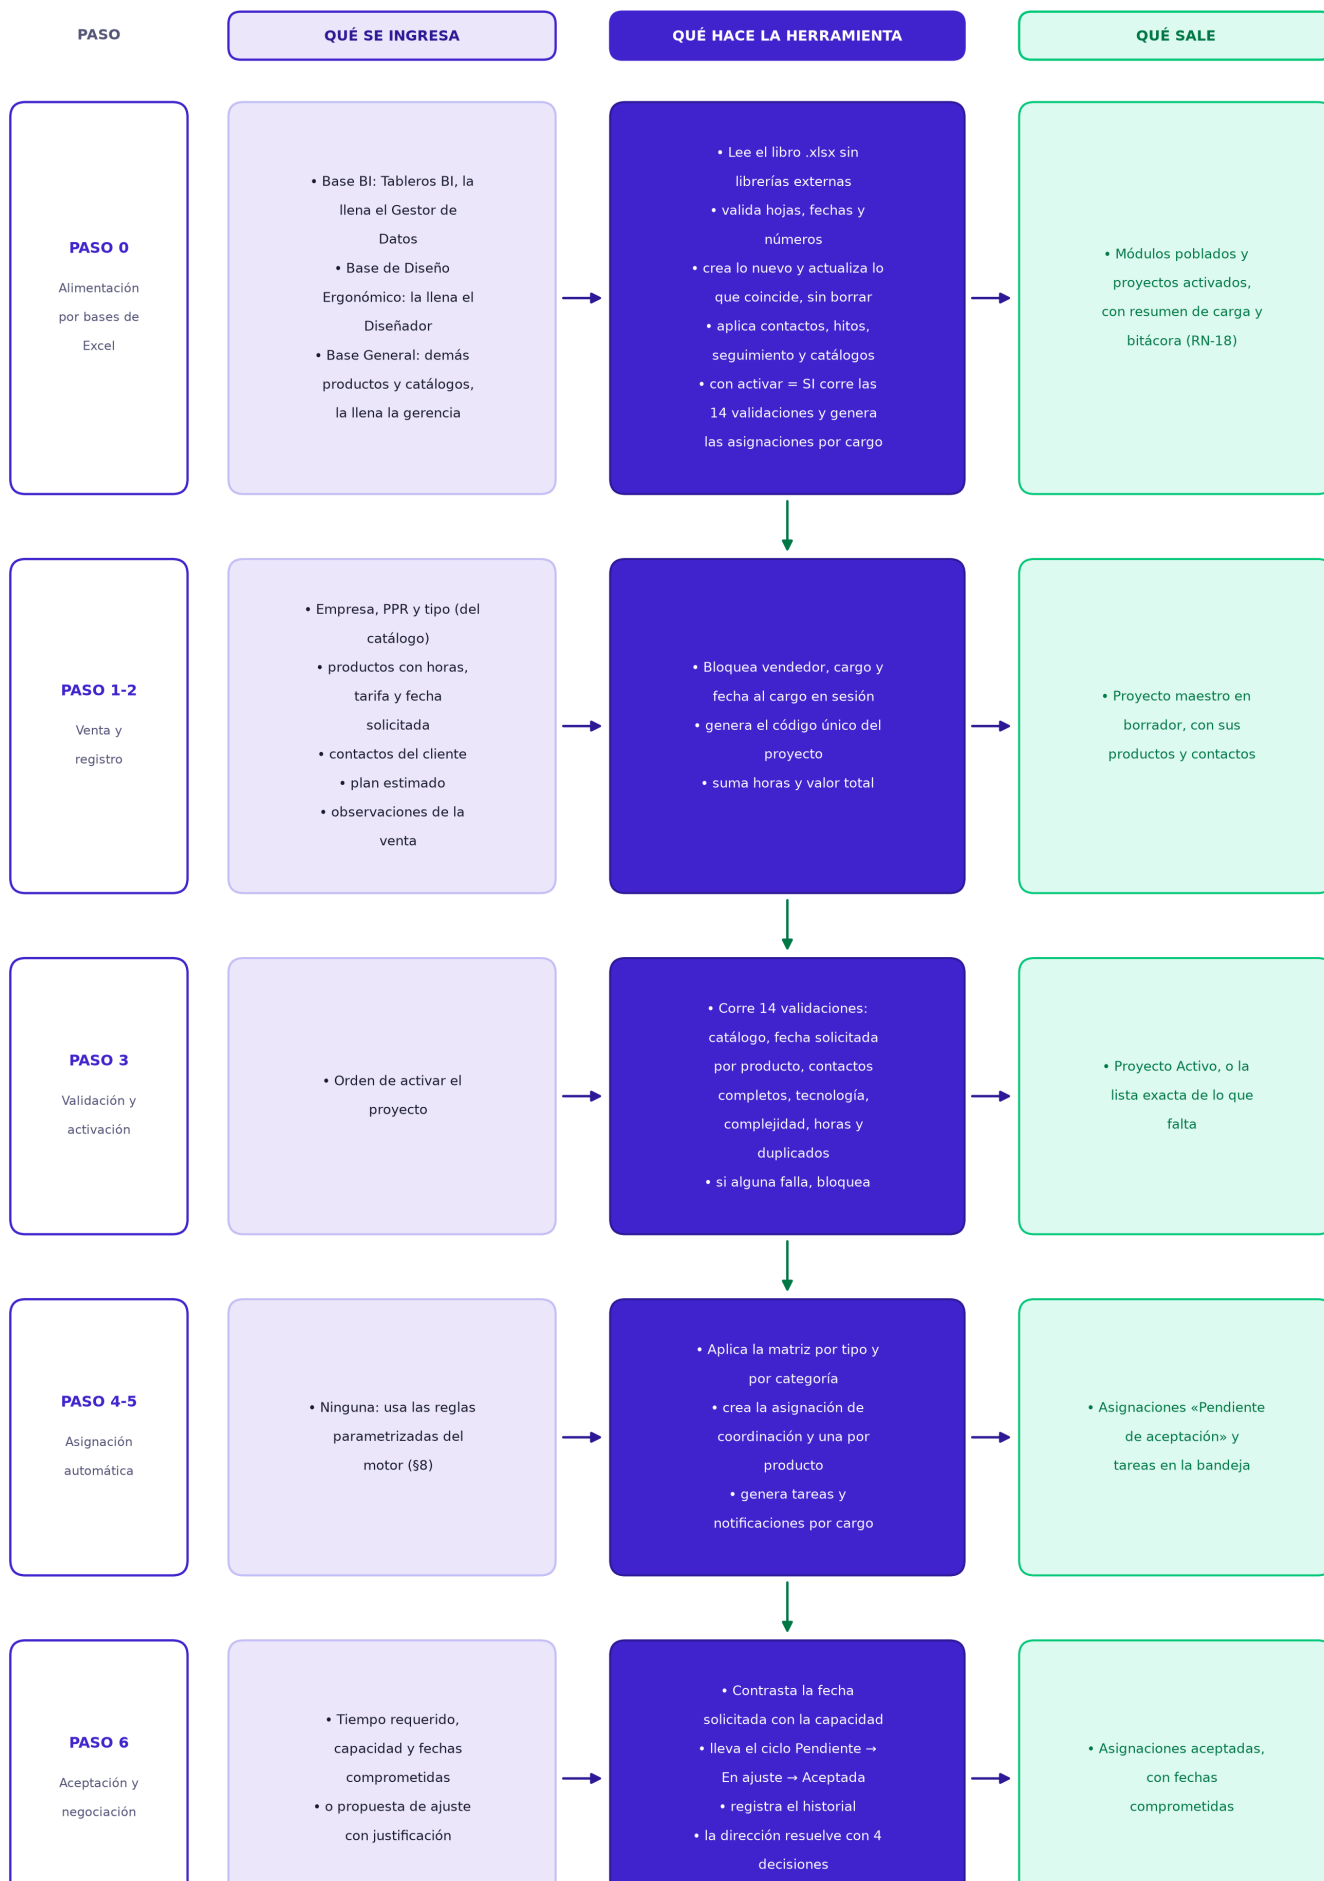

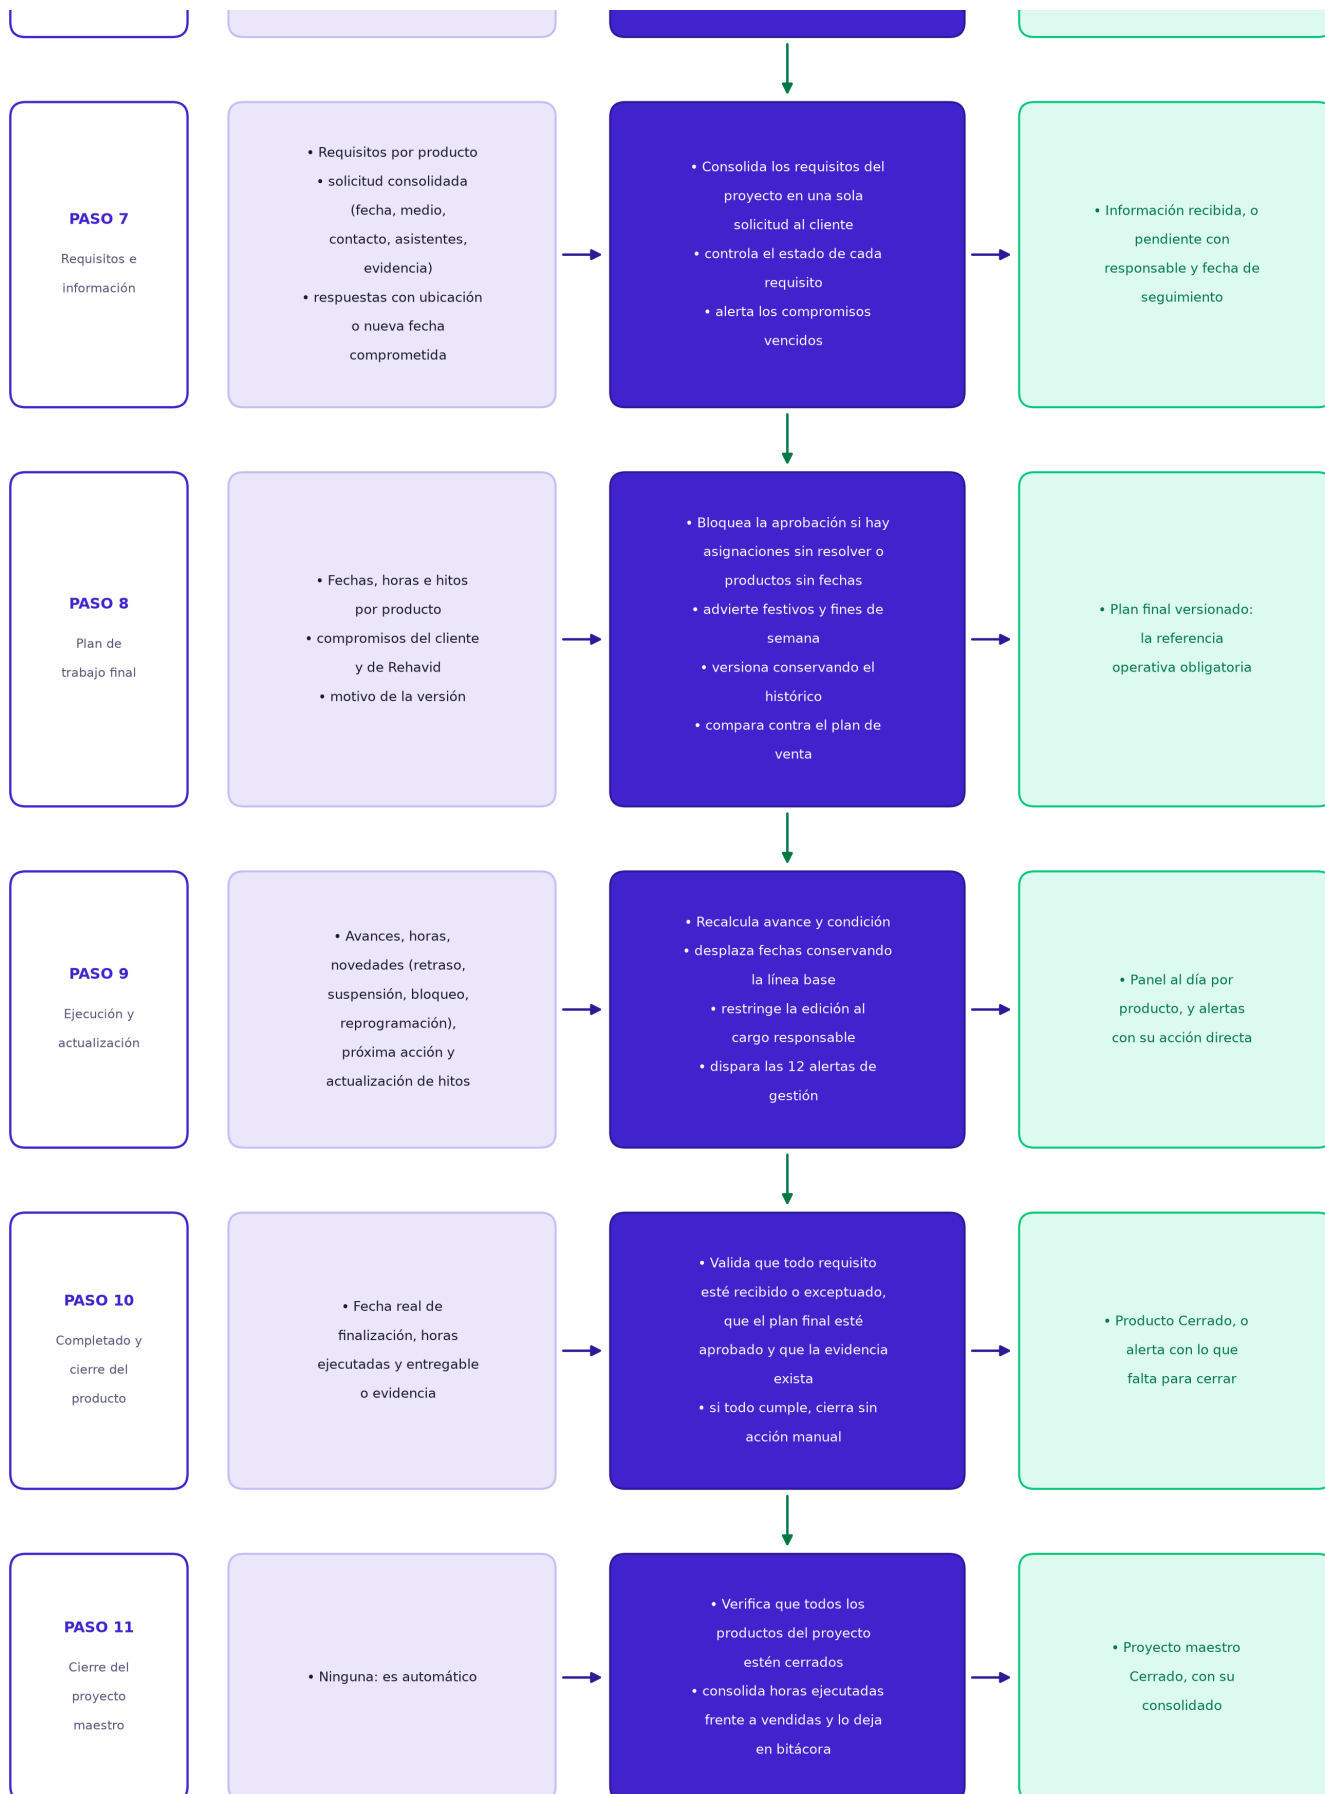

2 · Los módulos del aplicativo

Módulo	Qué hace	Quién lo usa
Guía (Para ti)	Explica cada módulo botón a botón, con pantallazos; primera visita arranca ahí.	Todos los cargos
Resumen	El portafolio: indicadores, tabla de proyectos (estado, avance, fecha prevista, propietario) y análisis con clic para filtrar.	Todos (los valores en dinero, solo administradores)
Actividades	Todas las actividades como tablero kanban o lista ordenable; atajo «Mi cargo».	Todos los cargos
Mi trabajo	La bandeja del cargo: aceptar o negociar asignaciones y coordinaciones, «Actualizar» (avances y retrasos), «Hitos», requisitos y cierre. Los administradores además resuelven los ajustes de todos.	Cada cargo su bandeja
Calendario	La programación del mes con festivos de Colombia; el día completo abre su detalle; panel de actividad no programada.	Todos los cargos
Ficha del proyecto	El detalle completo: maestro, productos, contactos, plan de trabajo final versionado y bitácora (RN-18).	Todos; edición según permisos
Crear	El registro de la venta en 4 pasos con 14 validaciones y activación automática.	Solo administradores (RN-01)
Parametrización	Catálogos, tarifas y reglas del motor de asignación.	Solo administradores
Bases y auditoría	Carga de las tres bases de Excel, respaldos, descargas (RN-07) e historial de cambios.	Solo administradores

Resumen

Rehavid

Gestión de proyectos

Q

Buscar empresa, proyecto, PPR, producto o responsable...

+ Crear

6

Gerente

Gerente

Para ti - Guía

Resumen

Mi trabajo

Espacio

Rehavid Operaciones

Actividades

Calendario

Empresas con proyectos activos

Alimentos del Norte S.A.

2

Metalúrgica Andina S.A.S.

1

Configuración

Parametrización

Bases y auditoría

venta - registro - activación - asignación - capacidad - plan final - ejecución - cierre

guardado 11:52 p. m.

Espacio / Rehavid S.A.S. · Operaciones

Resumen

El portafolio de un vistazo: proyectos, estado, avance y análisis

Resumen

Actividades

Mi trabajo

Calendario

Demostración

4 proyecto(s) demostrativos. No representan la operación real.

Eliminar datos demostrativos

Tipo de proyecto

Empresa

PPR

Estado del proyecto

Estado del producto

Limpiar

Proyectos activos

30 en borrador

Productos vendidos

75 abiertos

Asignaciones sin resolver

1 pendientes o en ajuste

Productos retrasados

13 en riesgo

4 proyecto(s)

El portafolio maestro: estado, avance, fecha prevista, quién coordina y su última actualización - clic en el nombre para abrir la ficha

Proyecto	Empresa	Estado	Avance	Fecha prevista	Propietario	Última actualización
DEM-001 · Tipo 2	Alimentos del Norte S.A.	Atrasado	0.4	8 de sept	Director de Proyectos	Hoy
DEM-003 · Tipo 2	Metalúrgica Andina S.A.S.	En riesgo	0.7	25 de ago	Director de Proyectos	Hoy
DEM-002 · Tipo 1	Alimentos del Norte S.A.	En riesgo	0.4	6 de sept	Jefe de Operaciones	Hoy
DEM-004 · Tipo 1	Textiles del Sur Ltda.	Finalizado	1.0	7 de ago	Jefe de Operaciones	Hoy

Por tipo de proyecto

Clasificación que gobierna la coordinación asignada

4 proyectos

Tipo 1

Tipo 2

2 proy. 50%

2 proy. 50%

Tipo	Coordinación	Proyectos	Productos	Horas	Valor	
Tipo 1	Jefe de Operaciones		2	2	190	\$ 18.5 M
Tipo 2	Director de Proyectos		2	5	360	\$ 42.3 M

3 · La gestión diaria

Mi trabajo · la bandeja de cada cargo

RH

Rehavid

Gestión de proyectos

Q

Buscar empresa, proyecto, PPR, producto o responsable...

+ Create

DD

Director de Proyectos

Para ti - Guía

Resumen

Mi trabajo 2

Espacio

Rehavid Operaciones

Actividades

Calendario

Empresas con proyectos activos

Alimentos del Norte S.A. 2

Metalúrgica Andina S.A.S. 1

Configuración

Parametrización

Bases y auditoría

Espacio / Rehavid S.A.S. · Operaciones

Mi trabajo

Lo que le corresponde a su cargo: aceptar asignaciones, actualizar avances y retrasos, y atender sus alertas

Resumen

Actividades

Mi trabajo 2

Calendario

Demostración

4 proyecto(s) demostrativos. No representan la operación real.

Eliminar datos demostrativos

Empresa

Tipo de proyecto

Condición

Todos (3)

Todos (2)

Todos (3)

Limpiar

Mi trabajo · Director de Proyectos

Sus asignaciones y coordinaciones, con sus alertas dentro de cada tarjeta. Acepte, proponga ajuste y registre avances y retrasos con «Actualizar».

ROL

Director de Proyectos

Pendientes de aceptación

En ajuste

Aceptadas

Coordinación de proyectos

1

1

2

2

Coordinación de proyectos

Asignación independiente de las de producto, con su propio ciclo (Pendiente - En ajuste - Aceptada).

Coordinación Tipo 2 · DEM-001

Alimentos del Norte S.A. · 3 producto(s) · 220 h vendidas

Asignación: Aceptada

Plan estimado de la venta

Mediciones en dos sedes durante seis semanas, tablero de seguimiento y cápsulas para líderes.

Contacto principal

Ana Restrepo

ana.restrepo@alimentosnorte.demo

Fecha de referencia

sin fecha

Abrir proyecto

Coordinación Tipo 2 · DEM-003

Metalúrgica Andina S.A.S. · 4 producto(s) · 240 h vendidas

Asignación: En ajuste

Plan estimado de la venta

Rediseño de dos puestos críticos con validación in sitio y tablero de control de avance.

Contacto principal

Marta Gil

marta.gil@metalandina.demo

Fecha de referencia

30 de ago

Propuesta

13 de sept

La parada de mantenimiento se corrió dos semanas; la referencia de coordinación debe moverse con ella.

17 de ago 01:08 a. m.

Ajuste propuesto

Director de Proyectos (Director de Proyectos) · Nueva referencia por corrimiento de la parada de mantenimiento.

venta · registro · activación · asignación · capacidad · plan final · ejecución · cierre

guardado 01:08 a. m.

El botón «Actualizar» · avances y retrasos en un solo formulario

RHRehavid

Gestión de proyectos

Q

Buscar empresa, proyecto, PPR, producto o responsable...

+ Crear

DD

Director de Proyectos

Director de Proyectos

Para ti - Guía

Resumen

Mi trabajo

Resumen

Actividades

Calendario

Resumen

Actividades

Calendario

Plan estimado de la venta

Rediseño de dos puestos críticos con validación en sitio y tablero de control de avance.

Contacto principal

Marta Gil

marta.gil@metalandina.demio

Fecha de referencia

sin fecha

Abrir proyecto

Actualizar · Mediciones objetivas de carga física

El líder del producto mantiene actualizado el panel: avance, horas, fechas, novedades y próxima acción (§11).

Qué registra *

Avance

Avance

76% calculado desde los hitos.

Horas ejecutadas

104

Descripción de la novedad *

Próxima acción

Consolidar informe de resultados de la sede sur

Fecha de la próxima acción

08/21/2026

Cancelar

Guardar actualización

10 de ago 11:52 p. m.

Avance · Sesión de la sede norte ejecutada al cien por ciento.

Gerente (Gerente)

7 de ago 11:52 p. m.

Retraso · La sede sur aplazó la ventana de medición por paro de línea.

Acción: Reprogramar la sesión y recuperar en la semana siguiente. · Nueva fecha: 16 de ago · Gerente (Gerente)

Actualizar

Hitos (3)

Requisitos de información

Declarar completado

Reasignar cargo

Abrir ficha

venta · registro · activación · asignación · capacidad · plan final · ejecución · cierre

guardado 11:52 p. m.

4 · El seguimiento visual

Actividades · tablero por momento del proceso

Para ti · Guía

Resumen

Mi trabajo

Rehavid Operaciones

Actividades

Calendario

Empresas con proyectos activos

Alimentos del Norte S.A. 2

Metalúrgica Andina S.A.S. 1

Configuración

Parametrización

Bases y auditoría

venta · registro · activación · asignación · capacidad · plan final · ejecución · cierre

guardado 11:52 p. m.

Rehavid

Gestión de proyectos

Buscar empresa, proyecto, PPR, producto o responsable...

+ Crear

Gerente

Espacio / Rehavid S.A.S. · Operaciones

Actividades

Todas las actividades como tablero o como lista; clic en una para gestionarla

Resumen

Actividades

Mi trabajo

Calendario

Demostración

4 proyecto(s) demostrativos. No representan la operación real.

Eliminar datos demostrativos

Empresa

Todos (3)

Tipo de proyecto

Todos (2)

Cargo responsable

Todos (5)

Condición

Todos (3)

Categoría

Todos (5)

Limpiar

Tablero

Lista

POR HACER 2

Tablero BI de seguimiento

Alimentos del Norte S.A.

Tablero BI

En riesgo

DEM-001

GO

Cápsulas formativas

Alimentos del Norte S.A.

Cápsulas

DEM-001

8 de sept

SC

EN CURSO 2

Mediciones objetivas de carga física

Alimentos del Norte S.A.

Medición objetiva

Retrasado

DEM-001

16 de ago

GO

Acompañamiento técnico

Alimentos del Norte S.A.

Otro

En riesgo

DEM-002

6 de sept

JO

EN PAUSA 1

Diseño de puesto de trabajo

Metalúrgica Andina S.A.S.

Diseño

En riesgo

DEM-003

25 de ago

P

FINALIZADA 2

Tablero BI de seguimiento

Metalúrgica Andina S.A.S.

Tablero BI

DEM-003

15 de ago

GO

Diagnóstico ergonómico

Textiles del Sur Ltda.

Otro

DEM-004

7 de ago

JO

El estado de cada tarjeta se mueve con las acciones del proceso (aceptar la asignación, registrar avances y novedades, suspender o reanudar, declarar completado); abre la tarjeta para gestionarla. Los filtros y la búsqueda acotan el tablero.

RH

Rehavid

Gestión de proyectos

Q

Buscar empresa, proyecto, PPR, producto o responsable...

+ Crear

DD

Director de Proyectos

Director de Proyectos

Para ti - Guía

Resumen

Mi trabajo

Espacio

RO

Rehavid Operaciones

00

Actividades

Calendario

Empresas con proyectos activos

Alimentos del Norte S.A.

2

Metalúrgica Andina S.A.S.

1

Configuración

Parametrización

Bases y auditoría

venta - registro - activación - asignación - capacidad - plan final - ejecución - cierre

guardado 11:52 p. m.

Espacio / Rehavid S.A.S. - Operaciones

Calendario

Programación consolidada con festivos de Colombia y actividad no programada

Resumen

Actividades

Mi trabajo

Calendario

Demostración

4 proyecto(s) demostrativos. No representan la operación real.

Eliminar datos demostrativos

Empresa

Todos (3)

Tipo de proyecto

Todos (2)

Cargo responsable

Todos (5)

Limpiar

Hoy

--

--

Agosto 2026

Todas las empresas - 4 proyecto(s) - 21 evento(s)

Festivos

7 de ago Batalla de Boyacá

17 de ago Asunción

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
27	28	29	30	31	1	2
			Inicio - Tablero ... Metalúrgica Andina...		Inicio - Diseño d... Metalúrgica Andina...	
3	4	5	6	7	8	9
		Levantamiento ... Metalúrgica Andina...		Batalla de Boyacá Objetivo - Diagn... Textiles del Sur Ltda.		Inicio - Acompa... Alimentos del Norte...
10	11	12	13	14	15	16
	Sesión de medi... Alimentos del Norte... Visita 1 Alimentos del Norte...				Inicio - Cápsula... Alimentos del Norte... Objetivo - Tabler... Metalúrgica Andina...	Objetivo - Medic... Alimentos del Norte...
17	18	19	20	21	22	23
Asunción Informe de resul... Alimentos del Norte... Propuesta de di... Metalúrgica Andina...	Visita 2 Alimentos del Norte...			Consolidar infor... Alimentos del Norte... Cápsula 1 - man... Alimentos del Norte...		Revisión de sus... Metalúrgica Andina...
24	25	26	27	28	29	30
Visita 3 - verifi...	Grabar la cápsu...					

Actividad no programada

Actividades abiertas sin fecha de inicio ni fecha objetivo. Abre cada una para aceptar su asignación o comprometer fechas; al hacerlo aparecerá en el calendario.

Tablero BI de seguimiento

Alimentos del Norte S.A.

DEM-001

Pendiente de información

5 · Modelo de permisos (versión final)

Capacidad	Administradores CEO · Gerente · Director de Proyectos · Jefe de Operaciones	Demás cargos Supervisor · Gestor de Datos 1 y 2 · Diseñador
Crear proyectos (venta)	Sí (RN-01)	No — módulo bloqueado con explicación
Ver costos y gestión en dinero	Sí (tarifas, valores, facturación)	No — sin columnas ni campos de valor
Parametrización y Bases y auditoría	Sí (catálogos, reglas, cargas, respaldos)	No — «Módulo restringido»
Resolver ajustes y coordinaciones	Sí, desde «Para resolver como dirección»	Proponen; la administración decide
Aceptar asignaciones, actualizar avances y retrasos, hitos, requisitos, cierre	Sí, sobre lo propio	Sí, sobre lo propio (RN-12)
Reasignar productos	Sí, a cualquier cargo	Solo entre Gestor de Datos 1 ↔ 2
Consultar Resumen, Actividades, Calendario y fichas	Sí	Sí (sin valores en dinero)

Cómo se alimenta

- **Base_BI.xlsx** — Tableros BI (la diligencia el frente de datos; columna «responsable» para elegir gestor).
- **Base_Diseno_Ergonomico.xlsx** — Diseño ergonómico (la diligencia el Diseñador).
- **Base_General.xlsx** — demás productos y catálogos (la diligencia la administración).

La carga la ejecuta un administrador: crea lo nuevo y actualiza lo que coincide sin borrar nada; con activar = SI el proyecto queda Activo con sus asignaciones por cargo. Los datos viven en el navegador; el respaldo JSON de Bases y auditoría es el mecanismo de copia mientras llega la versión de servidor.
